


IDENTIFICATION / LOCALISATION

Nom: Branche No 10 de la Rivière des Couture # 11713
Type: Municipal
Lot(s): 309
Rang: Plaisance
Cadastre: Paroisse de Saint-Joseph
Municipalité: Ville de Lévis
MRC:

SECTION AU SITE DE TRAVERSÉE

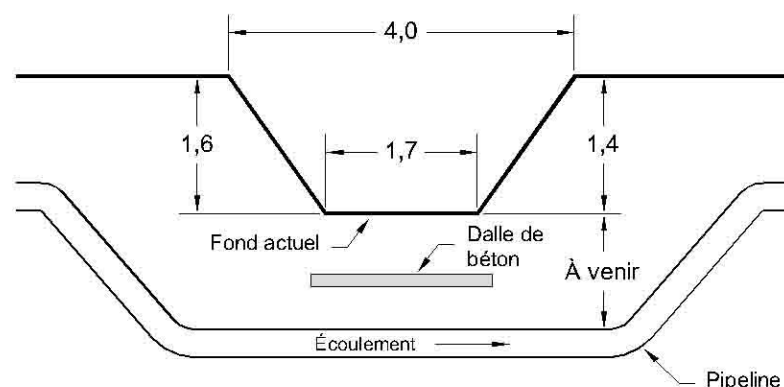

- Dimensions approximatives (m)
- Couverture minimale projetée sous le fond actuel. Le relevé d'arpentage détaillé permettra d'établir de façon précise la couverture minimale à respecter.
- La dalle de béton peut ne pas être requise.

ÉVALUATION DES HABITATS POUR LA FAUNE ICHTYENNE

- **Intermittent:** Non
- **Profondeur d'eau (m)*:** Non déterminée / 0,1
- **Type d'écoulement*:** Non déterminé / lentique
- **Vitesse (m/s)*:** Non déterminée / 0,1
- **Substrat**:** Argile / cailloux, colmaté
- **Potentiel de frai au site de traversée:** Faible
- **Habitat d'alimentation - Espèces:** Mulet à cornes
- **Habitat sensible à l'aval:** Non
- **Obstacle à la migration vers l'amont:** Oui
- **Vulnérabilité:** Non vulnérable
- **Remarques:** Obstacles infranchissables en amont de la traversée. Les risques de transport des sédiments sont à leur maximum en mai et juin. Habitats aquatiques de faible qualité.
- **Période recommandée de franchissement:** Aucune restriction
- **Suivi recommandé après la construction:** Aucun

* Mesure printanière / mesure estivale

** Substrat dominant / sous-dominant

MILIEU ENVIRONNANT

Topographie: Plane
Utilisation du sol: Cultivé
Type de sol (selon carte pédologique): Sable loameux St-Jude, sable fin St-Samuel


PHOTO AU SITE DE TRAVERSÉE



REMISE EN ÉTAT

Lit: Matériel original
Talus: Pente originale
Stabilisation: Ensemencement ou empierrement ou combinaison des deux

MÉTHODE DE CONSTRUCTION

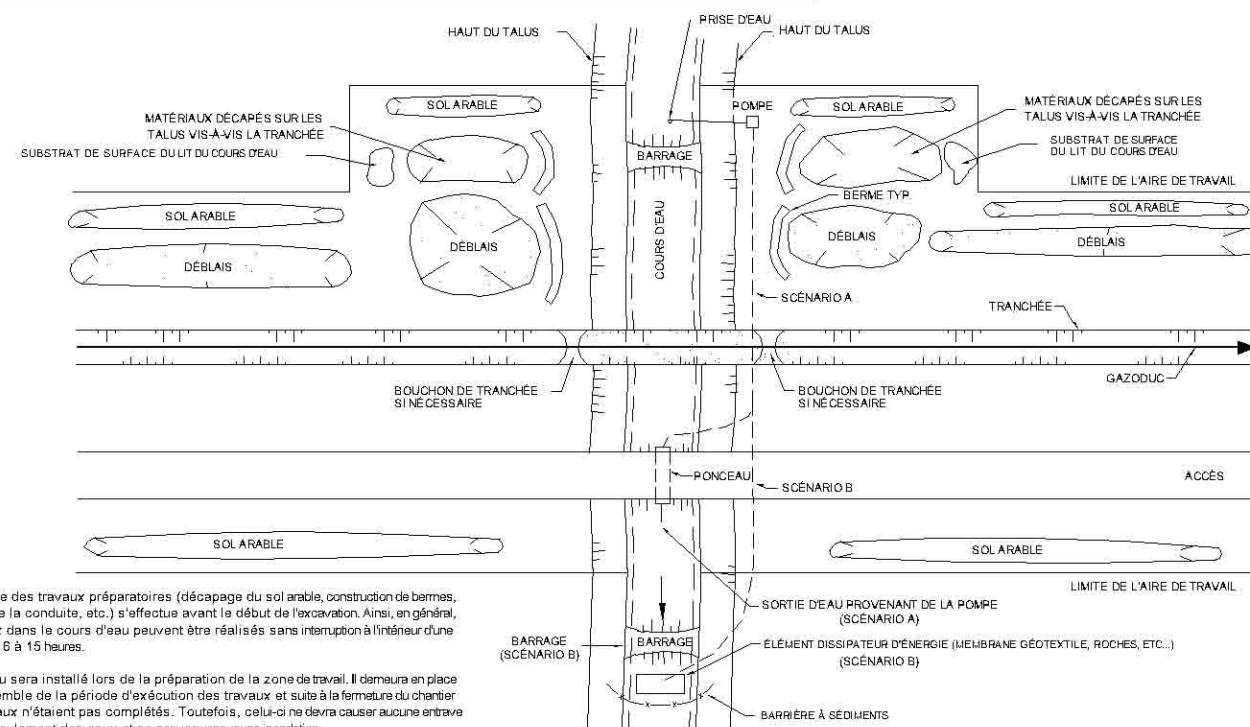

Notes: - L'ensemble des travaux préparatoires (décapage du sol arable, construction de bermes, soudage de la conduite, etc.) s'effectue avant le début de l'excavation. Ainsi, en général, les travaux dans le cours d'eau peuvent être réalisés sans interruption à l'intérieur d'une période de 6 à 15 heures.

- Le ponceau sera installé lors de la préparation de la zone de travail. Il demeurera en place pour l'ensemble de la période d'exécution des travaux et suite à la fermeture du chantier si les travaux n'étaient pas complétés. Toutefois, celui-ci ne devra causer aucune entrave au libre écoulement des eaux et ne provoquer aucune inondation.

- Le décapage du sol arable de part et d'autre du cours d'eau s'effectue seulement en milieu cultivé.

- La méthode de construction et le plan de contrôle des sédiments proposés pourront être ajustés lors des travaux d'implantation du gazoduc et ce, en fonction du débit du cours d'eau et des matériaux rencontrés lors de l'excavation.

- Cette vue en plan est un croquis type et n'est nullement conçue à des fins de construction.

TRAVERSÉE À SEC D'UN COURS D'EAU BARRAGE ET POMPAGE

Vue en plan

NO	DATE	REVISION	APP	Projet
				GAZODUC-TERMINAL / SAINT-NICOLAS
				Titre: Fiche synthèse des cours d'eau
				Préparé par: Hélène Arsenault, agr. M.Env.
				Dessiné par: Josée Bisson, dta
				Approuvé par: Claude Veilleux, ing. & agr.
				Fichier: 3324f01.dwg
				Date: Janvier 2006
				Références: Feuille: 5 de 24 Chainage: 7+290
				Fiche no: 5



Groupes Conseil UDA inc.
Agriculture, foresterie et environnement
