


## IDENTIFICATION / LOCALISATION

**Nom:** Cours d'eau Guay # 16057  
**Type:** Municipal  
**Lot(s):** 229  
**Rang:** Rang Pin Tendre  
**Cadastre:** Paroisse Notre-Dame-de-la-Victoire  
**Municipalité:** Ville de Lévis  
**MRC:**

## SECTION AU SITE DE TRAVERSÉE

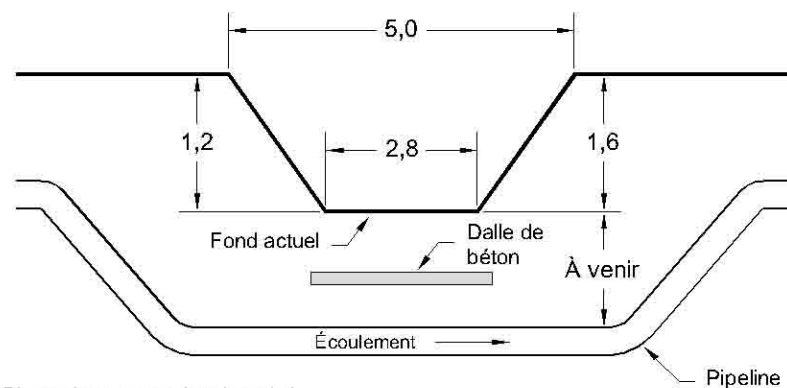

- Dimensions approximatives (m)
- Couverture minimale projetée sous le fond actuel. Le relevé d'arpentage détaillé permettra d'établir de façon précise la couverture minimale à respecter.
- La dalle de béton peut ne pas être requise.

## ÉVALUATION DES HABITATS POUR LA FAUNE ICHTYENNE

- **Intermittent:** Oui
- **Profondeur d'eau (m)\*:** Non déterminée / 0,02
- **Type d'écoulement\*:** Non déterminé / lentique
- **Vitesse (m/s)\*:** Non déterminée / nulle
- **Substrat\*\*:** Argile / argile, compacté
- **Potentiel de frai au site de traversée:** Nul
- **Habitat d'alimentation - Espèces:** Non pêché
- **Habitat sensible à l'aval:** Non
- **Obstacle à la migration vers l'amont:** Non
- **Vulnérabilité:** Non vulnérable
- **Remarques:** Risques de transport de sédiments en mai et juin.
- **Période recommandée de franchissement:** Aucune restriction
- **Suivi recommandé après la construction:** Aucun

\* Mesure printanière / mesure estivale

\*\* Substrat dominant / sous-dominant

## MILIEU ENVIRONNANT

**Topographie:** Plane  
**Utilisation du sol:** Cultivé  
**Type de sol (selon carte pédologique):** Sable loameux St-Jude, sable fin St-Samuel


## PHOTO AU SITE DE TRAVERSÉE



## REMISE EN ÉTAT

**Lit:** Matériel original  
**Talus:** Pente originale  
**Stabilisation:** Ensemencement ou empierrement ou combinaison des deux

## MÉTHODE DE CONSTRUCTION

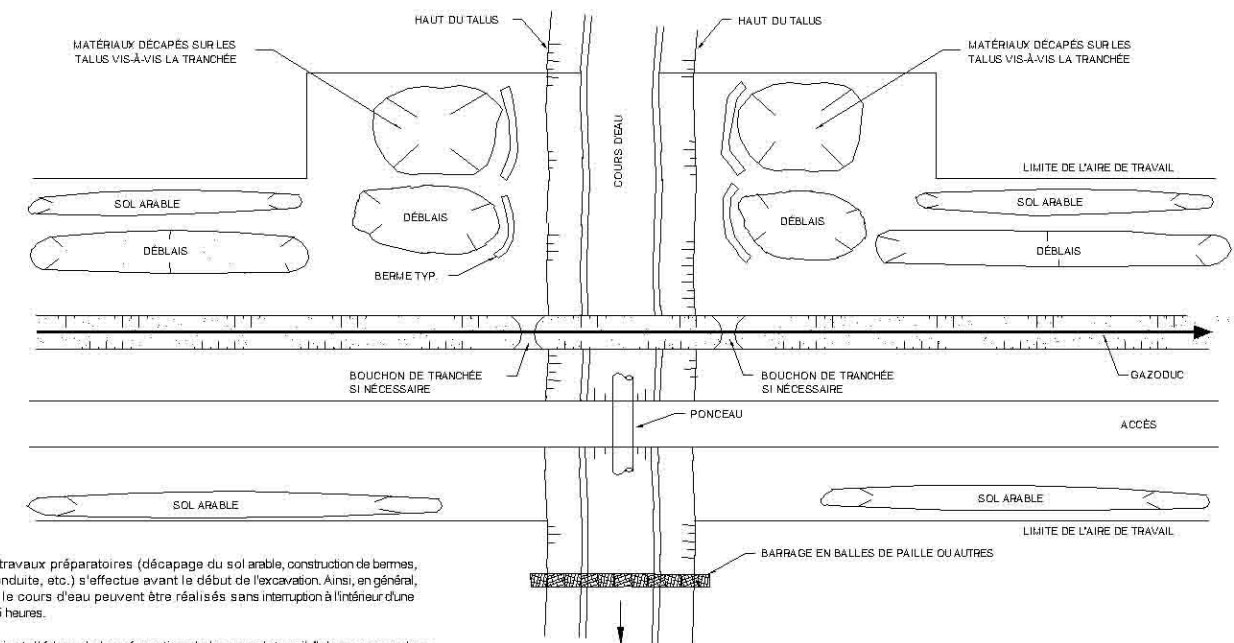

Notes: - L'ensemble des travaux préparatoires (décapage du sol arable, construction de bannes, soudage de la conduite, etc.) s'effectue avant le début de l'excavation. Ainsi, en général, les travaux dans le cours d'eau peuvent être réalisés sans interruption à l'intérieur d'une période de 6 à 15 heures.

- Le ponceau sera installé lors de la préparation de la zone de travail. Il demeurera en place pour l'ensemble de la période d'exécution des travaux et suite à la fermeture du chantier si les travaux n'étaient pas complétés. Toutefois, celui-ci ne devra causer aucune entrave au libre écoulement des eaux et ne provoquer aucune inondation.

- Le décapage du sol arable de part et d'autre du cours d'eau s'effectue seulement en milieu cultivé.

- La méthode de construction et le plan de contrôle des sédiments proposés pourront être ajustés lors des travaux d'implantation du gazoduc et ce, en fonction du débit du cours d'eau et des matériaux rencontrés lors de l'excavation.

- Cette vue en plan est un croquis type et n'est nullement conçue à des fins de construction.

### TRAVERSÉE À SEC D'UN COURS D'EAU COURS D'EAU INTERMITTENT SANS ÉCOULEMENT

Vue en plan

NO	DATE	RÉVISION	APP.	Projet:
				<b>GAZODUC-TERMINAL / SAINT-NICOLAS</b>
				Titre: <b>Fiche synthèse des cours d'eau</b>
				Préparé par: Hélène Arsenault, agr. M. Env.
				Dessiné par: Josée Bisson, dta
				Approuvé par: Claude Veilleux, ing. & agr.
				Fichier: 3324f01.dwg
				Date: Janvier 2006
				Références: Feuille: 6 de 24 Chainage: 10+385
				<b>Fiche no: 9</b>



UDA Groupe Conseil UDA inc.  
Agriculture, foresterie et environnement
