Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs

Québec 🖼 🖼

RAPPORT D'INSPECTION

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides

N/RÉFÉRENCE: 7610-14-01-04679-01

DATE DE RÉDACTION: 2006-05-10

SAGIR N/INTERVENTION:

T. IDENTIFICATION		
DATE D'INSPECTION : 2006-	05-04 Arrivée : 1	10h30
INSPECTEUR : ALAIN MIRON	N Départ : 1	2h15
ACCOMPAGNÉ DE : ALAIN L LUC I	ATREILLE, Analyste DGAE BONNEAU, Analyste Service	
sur les lots 107-3, 107-9 et P-109 d		
PLAIGNANT(E): N/A	Rencontré : oui	non
NOM	ADRESSE	TÉLÉPHONE
DEDGOADHEGO DENGOAISDÁE	(0)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PERSONNE(S) RENCONTRÉE NOM Pascal Masciotra	(8): FONCTION Tellus, directeur	TÉLÉPHONE (514) 365-6249
27-24	23-24	r
	Appen }	
PIÈCE(S) ANNEXÉE(S):		
PHOTO(S) Nombre: 10	CROQUIS [PLAN(S) [☐ CARTE(S) ☐
AUTRE(S) ANNEXE(S) :		
1.		
BUT(S): Vérifier la conformit de sols contaminés.	é des travaux d'aménagement	de la cellule d'enfouissement

SAGIR N/INTERVENTION:

2. DESCRIPTION DELPINSPECTION

Un certificat d'autorisation a été émis le 5 décembre 2005 pour l'aménagement et l'exploitation d'une cellule d'enfouissement de sols contaminés n'excédant pas le critère « C » de la Politique des sols.

Le projet comprend les aménagements suivants :

- une cellule dont la capacité sera de 668 000 mètres cubes ;
- une aire asphaltée pour le lavage des camions ;
- une aire asphaltée pour l'entreposage temporaire des sols ;
- un système de traitement des eaux de lixiviation;
- construction de routes et de fossés;

Les engagements <u>avant</u> d'entreprendre l'exploitation :

- fournir une garantie financière (cautionnement);
- soumettre les résultats des tests de poinconnement et de filtration ;
- analyser les C₁₀ à C₅₀ de l'eau souterraine;
- planter des arbres autour du site;

Une visite est réalisée sur le site avec les intervenants qui ont travaillé sur le projet. De plus, une demande de modification du certificat d'autorisation est remise à monsieur Latreille. Les modifications consistent à déplacer un peu plus au sud, les aménagements prévus pour le traitement des eaux, le lavage des camions, l'entreposage temporaire des sols. Le réseau de collecte des eaux de lixiviation sera également modifié.

Je constate que le creusage de la cellule est complété, il reste un peu de finition à faire avant de procéder à l'installation des membranes. Les fossés et les routes de service no.1 et no.2 sont aménagés. Les routes périphériques sont en construction. Les aménagements pour le traitement des eaux usées, l'entreposage temporaire des sols, la plantation d'arbres ne sont pas faits.

Il n'y a pas de réception de sols contaminés.

SAGIR N/INTERVENTION:

Le creusage de la cellule est terminé, l'installation des membranes. Il reste des eaux, le lavage des camions et l'é	e à faire tous le	s aménagements r		
Le rapport sur les essais de poinçonn l'analyse.	ement et de fil	tration a été remis	à monsieur Latrei	lle qui en fer
Une demande de modification de cert	tificat d'autoris	sation est à l'étude	à la DGAER.	:
				·
4. RECOMMANDATEON(S)				
Procéder à des inspections mensuelles	s afin de suivre	l'évolution des tr	avaux de construc	tion.
E HDENADHRICATHON				
		\wedge \wedge		
RÉDIGÉ PAR : ALAIN MIRON	V	Leun)	liven	2006-05-1
•	1	(Louin)	liven	2006-05-1
ÆRIFIÉ PAR :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Lown)	livon	2006-05-1
ÉRIFIÉ PAR :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Lein)	livon	2006-05-1
ÉRIFIÉ PAR :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Lown)	livon	2006-05-1
ÉRIFIÉ PAR :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Lown)	livon	2006-05-1
ÉRIFIÉ PAR :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Lown)	livon	2006-05-1
ÉRIFIÉ PAR :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Lown)	livon	2006-05-1
ÉRIFIÉ PAR :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Deen)	livon	2006-05-1
ÆRIFIÉ PAR :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Dein)	livon	2006-05-1
ÆRIFIÉ PAR :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Lown)	livon	2006-05-1
RÉDIGÉ PAR : ALAIN MIRON VÉRIFIÉ PAR : COMMENTAIRES DU VÉRIFICA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Louin)	livon	2006-05-1

de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides

Nom : Écolosol inc.

Date: 2006-05-10

Municipalité : Lots 107-3, 107-9 et P-109 du cadastre de la paroisse de St-Henri-de-Mascouche

N/D: 7610-14-01-04679-01

Photo # 1

Note: Fossé en bordure de la route de service no.1; à droite, la zone où sera aménagé l'unité de traitement des caux, les bassins des eaux traitées et de sédimentation et l'aire de lavage des camions.

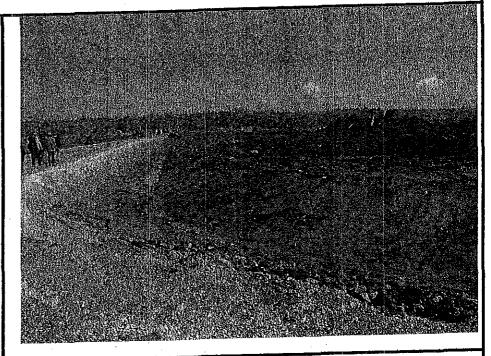


Photo # 2

Note: Fossé en bordure de la route de service no.2.

Photo # 3

Note: Vue de la cellule d'enfouissement des sols contaminés qui est en aménagement.



Photographié par : Alain Miron le 4 mai 2006

Nom : Écolosol inc.

Date: 2006-05-10

Municipalité : Lots 107-3, 107-9 et P-109 du cadastre de la paroisse de St-Henri-de-Mascouche

N/D: 7610-14-01-04679-01

Photo # : 4

Note: Vue de l'argile de couleur rougeâtre au fond de la cellule.





Photo # 5

Note: Travaux d'aménagement de la route périphérique no.4. Installation d'une membrane, de poussière de roche et de pierre concassée.

Photo # : 6

Note: Fossé de drainage de l'eau au fond de la cellule.



Nom : Écolosol inc.

Date: 2006-05-10

Municipalité : Lots 107-3, 107-9 et P-109 du cadastre de la paroisse de St-Henri-de-Mascouche

N/D: 7610-14-01-04679-01

Photo #: 7

Note: Vue des tas de terre et d'argile en surplus.


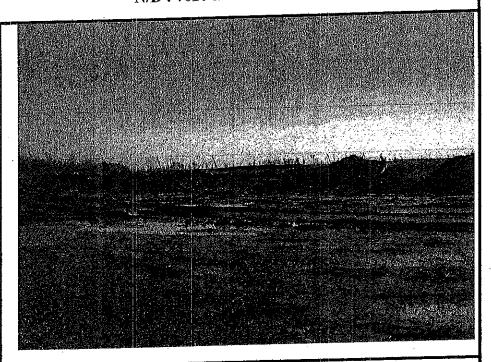


Photo # 8

Note: Fossé aménagé en bordure de la route périphérique no.3 qui n'est pas aménagée.

Photo # : 9

Note: Vue de la partie supérieure de la cellule, route périphérique no.2.

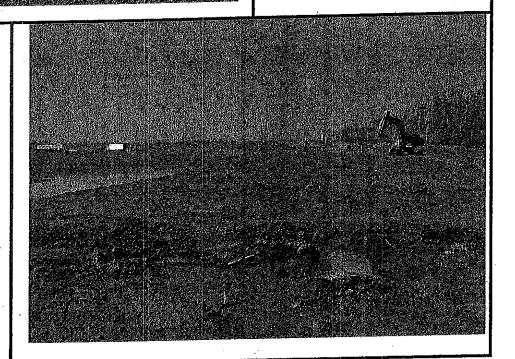

Photographié par : Alain Miron le 4 mai 2006

r nental

Nom : Écolosol inc.


Date: 2006-05-10

Municipalité : Lots 107-3, 107-9 et P-109 du cadastre de la paroisse de St-Henri-de-Mascouche

N/D: 7610-14-01-04679-01

Photo # : 10

Note: Vue rapprochée de l'argile dans la partie supérieure de la cellule, au coin des routes périphériques no.1 et no.2.



Photographié par : Alain Miron le 4 mai 2006
