


IDENTIFICATION / LOCALISATION

Nom : C. d. sans désignation
 Type : Naturel
 Lot(s) : 381
 Rang : Rang 11
 Cadastre : Partie du Canton de Wendover
 Municipalité : Notre-Dame-du-Bon-Conseil
 MRC : Drummond

SECTION AU SITE DE TRAVERSÉE



- Notes :
- Dimensions approximatives (m)
 - Couverture minimale projetée sous le fond actuel. Le relevé d'arpentage détaillé permettra d'établir de façon précise la couverture minimale à respecter.
 - La dalle de béton peut ne pas être requise.

ÉVALUATION DES HABITATS POUR LA FAUNE ICHTYENNE

- Intermittent : Oui
- Profondeur d'eau (m)* : Non déterminée / 0,04
- Type d'écoulement* : Non déterminé / lentique
- Vitesse (m/s)* : Non déterminée / < 0,1
- Substrat** : Organique, déposition
- Potentiel de fraie au site de traversée*** : Nul, nul, nul, nul
- Habitat d'alimentation - Espèces : Non pêché - cours d'eau parsemé de mares d'eau suite à une pluie
- Habitat sensible à l'aval : Non
- Obstacle à la migration vers l'amont : Non
- Vulnérabilité : Non vulnérable
- Remarque(s) : -
- Période recommandée de franchissement : Aucune restriction
- Suivi recommandé après la construction : Aucun

- Notes :
- * Mesure printanière / mesure estivale
 - ** Substrat dominant / sous-dominant
 - *** Potentiel de fraie pour salmonidés, espèces d'eau vive, espèces d'eau calme, cyprinidés

MILIEU ENVIRONNANT

Topographie : Vallonnée
 Utilisation du sol : Boisée
 Type de sol : Sable Saint-Jude
 (selon la carte pédologique)

PHOTO AU SITE DE TRAVERSÉE




REMISE EN ÉTAT

Lit : Matériel original
 Talus : Pente originale
 Stabilisation : Ensemencement ou empierrement ou combinaison des deux

MÉTHODE DE CONSTRUCTION

TRAVERSÉE À SEC - COURS D'EAU INTERMITTENT SANS ÉCOULEMENT

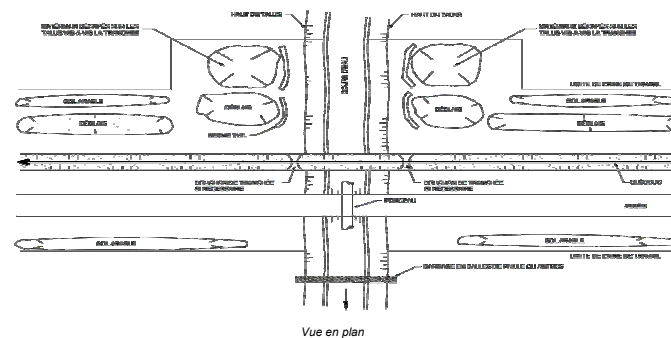

- Notes :
- L'ensemble des travaux préparatoires (décapage du sol sable, construction des bermes, soudage de la conduite, etc.) s'effectue avant le début de l'excavation. Ainsi, en général, les travaux dans les cours d'eau peuvent être réalisés sans interruption à l'intérieur d'une période de 6 à 15 heures.
 - Le ponton sera installé lors de la préparation de la zone de travail. Il demeurera en place pour l'ensemble de la période des travaux et suite à la fermeture du chantier si les travaux n'ont pas été complétés. Toutefois, celui-ci ne devra causer aucune entrave au libre écoulement des eaux et ne provoquer aucune inondation.

La méthode de construction et le plan de contrôle des sédiments proposés pourront être ajustés lors des travaux d'implantation du pipeline et ce, en fonction du débit du cours d'eau et des matériaux rencontrés lors de l'excavation.

Le décapage du sol sable de part et d'autre du cours d'eau s'effectue seulement en milieu cultivé.

Cette vue en plan est un croquis type et n'est nullement conçue à des fins de construction.



Projet : PIPELINE SAINT-LAURENT

Titre : Fiche synthèse des cours d'eau

Préparé par : Guy Avoine, B. Sc., biol.

Approuvé par : Claude Veilleux, ing. & agr.

Date : Septembre 2006

Fichier : 3325CD02.xls

Date	Révision	App.

Feuillet : 76 de 138

Fiche no : 76B

Groupement UDA inc.

Appréhension, éducation et environnement
