


IDENTIFICATION / LOCALISATION

Nom : Rivière Pénin # 4884
 Type : Municipal
 Lot(s) : 2295920 (544)
 Rang : Rang Saint-Augustin
 Cadastre : Paroisse de Saint-Jean-Chrysostome
 Municipalité : Lévis
 MRC : Lévis

SECTION AU SITE DE TRAVERSÉE



- Notes :
- Dimensions approximatives (m)
 - Couverture minimale projetée sous le fond actuel. Le relevé d'arpentage détaillé permettra d'établir de façon précise la couverture minimale à respecter.
 - La dalle de béton peut ne pas être requise.

ÉVALUATION DES HABITATS POUR LA FAUNE ICHTYENNE

- Intermittent : Non
- Profondeur d'eau (m)* : Non déterminée
- Type d'écoulement* : Non déterminé
- Vitesse (m/s)* : Non déterminée
- Substrat** : Non déterminé, Non déterminé
- Potentiel de fraie au site de traversée*** : Non déterminé, non déterminé, non déterminé, non déterminé
- Habitat d'alimentation - Espèces : Non déterminé
- Habitat sensible à l'aval : Non déterminé
- Obstacle à la migration vers l'amont : Non déterminé
- Vulnérabilité : Non déterminée
- Remarque(s) : Non déterminée
- Période recommandée de franchissement : Non déterminée
- Suivi recommandé après la construction : Non déterminé

- Notes :
- * Mesure printanière / mesure estivale
 - ** Substrat dominant / sous-dominant
 - *** Potentiel de fraie pour salmonidés, espèces d'eau vive, espèces d'eau calme, cyprinidés

MILIEU ENVIRONNANT

Topographie : Vallonnée
 Utilisation du sol : Boisée
 Type de sol : Terre noire bien décomposée + tourbe grossière (sphaignes)
 (selon la carte pédologique)

PHOTO AU SITE DE TRAVERSÉE




REMISE EN ÉTAT

Lit : Matériel original
 Talus : Pente originale
 Stabilisation : Ensemencement ou empierrement ou combinaison des deux

MÉTHODE DE CONSTRUCTION

TRAVERSÉE À SEC - BARRAGE ET POMPAGE

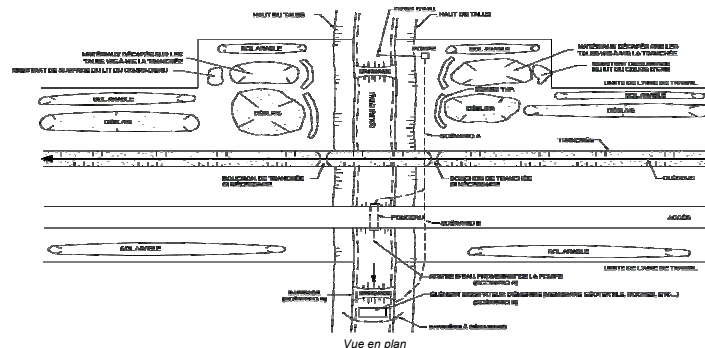

- Notes :
- L'ensemble des travaux préparatoires (décapage du sol arable, construction des bermes, soudage de la conduite, etc.) s'effectue avant le début de l'excavation. Ainsi, en général, les travaux dans les cours d'eau peuvent être réalisés sans interruption à l'intérieur d'une période de 6 à 15 heures.

Le ponton sera installé lors de la préparation de la zone de travail. Il demeurera en place pour l'ensemble de la période des travaux et suite à la fermeture du chantier si les travaux n'ont pas été complétés. Toutefois, celui-ci ne devra causer aucune entrave au libre écoulement des eaux et ne provoquer aucune inondation.

La méthode de construction et le plan de contrôle des sédiments proposés pourront être ajustés lors des travaux d'implantation du ponton et ce, en fonction du débit du cours d'eau et des matériaux rencontrés lors de l'excavation.

Le décapage du sol arable de part et d'autre du cours d'eau s'effectue seulement en milieu cultivé.

Cette vue en plan est un croquis type et n'est nullement conçue à des fins de construction.

Date	Révision	App.



Projet :	PIPELINE SAINT-LAURENT	
Titre :	Fiche synthèse des cours d'eau	
Préparé par :	Guy Avoine, B. Sc., bio.	
Approuvé par :	Claude Veilleux, ing. & agr.	
Date :	Septembre 2006	Foillet : 7 de 138
Fichier :	3325CD02.xls	Fiche no : 7A



Groupe Conseil UDA inc.
 Agricultrice, Génie et Environnement
