Annexe C
Échéancier de réalisation du Complexe Turcot

Transports Québec

Complexe Turcot
Échéancier de réalisation

Consortium SNC·LAVALIN / CIMA

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	Acquisitions de terrains	522 jours	Ven 09-01-02	Ven 10-12-31
2	Évaluation gouvernemantale	153 jours	Jeu 09-04-02	Dim 09-11-01
3	Plans, devis et surveillance	1971 jours	Mer 09-07-01	Sam 16-12-31
4	**Phase 1**	**923 jours**	**Jeu 09-10-01**	**Dim 13-03-31**
5	**Phase 1A**	**658 jours**	**Jeu 09-10-01**	**Sam 12-03-31**
6	Secteur Turcot	457 jours	Jeu 09-10-01	Mer 11-06-29
7	Secteur De La Vérendrye	262 jours	Jeu 10-07-01	Jeu 11-06-30
8	Secteur A-720	198 jours	Ven 11-04-01	Sam 11-12-31
9	Secteur Montréal-Ouest	67 jours	Dim 12-01-01	Sam 12-03-31
10	Secteur A-20	67 jours	Dim 12-01-01	Sam 12-03-31
11	Secteur Angrignon	67 jours	Dim 12-01-01	Sam 12-03-31
12	Secteur CN	457 jours	Jeu 09-10-01	Mer 11-06-29
13	**Phase 1B**	**465 jours**	**Ven 11-07-01**	**Dim 13-03-31**
14	Secteur Turcot	267 jours	Ven 11-07-01	Sam 12-06-30
15	Secteur De La Vérendrye	267 jours	Ven 11-07-01	Sam 12-06-30
16	Secteur A-720	134 jours	Dim 12-01-01	Sam 12-06-30
17	Secteur Montréal-Ouest	134 jours	Dim 12-04-01	Dim 12-09-30
18	Secteur A-20	265 jours	Dim 12-04-01	Dim 13-03-31
19	Secteur Notre-Dame	67 jours	Dim 12-07-01	Dim 12-09-30
20	**Phase 1C**	**198 jours**	**Dim 12-07-01**	**Dim 13-03-31**
21	Secteur Turcot	133 jours	Dim 12-07-01	Lun 12-12-31
22	Secteur De La Vérendrye	198 jours	Dim 12-07-01	Dim 13-03-31
23	Secteur A-720	133 jours	Dim 12-07-01	Lun 12-12-31
24	Secteur Notre-Dame	66 jours	Lun 12-10-01	Lun 12-12-31
25	**Phase 1D**	**265 jours**	**Dim 12-04-01**	**Dim 13-03-31**
26	Secteur Turcot	65 jours	Mar 13-01-01	Dim 13-03-31
27	Secteur A-720	65 jours	Mar 13-01-01	Dim 13-03-31
28	Secteur Angrignon	67 jours	Dim 12-04-01	Sam 12-06-30
29	**Phase 2**	**522 jours**	**Lun 13-04-01**	**Mar 15-03-31**
30	**Phase 2A**	**522 jours**	**Lun 13-04-01**	**Mar 15-03-31**
31	Secteur Turcot	131 jours	Lun 13-04-01	Lun 13-09-30
32	Secteur Montréal-Ouest	66 jours	Lun 13-07-01	Lun 13-09-30
33	Secteur A-20	65 jours	Lun 13-04-01	Dim 13-06-30
34	Secteur CN	522 jours	Lun 13-04-01	Mar 15-03-31
35	Mise en service secteur CN	1 jour	Mar 15-03-31	Mar 15-03-31
36	**Phase 2B**	**130 jours**	**Mar 13-10-01**	**Lun 14-03-31**
37	Secteur Turcot	130 jours	Mar 13-10-01	Lun 14-03-31
38	Secteur A-720	130 jours	Mar 13-10-01	Lun 14-03-31
39	Secteur Montréal-Ouest	130 jours	Mar 13-10-01	Lun 14-03-31
40	**Phase 2C**	**131 jours**	**Mar 14-04-01**	**Mar 14-09-30**
41	Secteur Turcot	131 jours	Mar 14-04-01	Mar 14-09-30
42	Secteur A-720	65 jours	Mar 14-04-01	Lun 14-06-30
43	Secteur Montréal-Ouest	65 jours	Mar 14-04-01	Lun 14-06-30
44	Secteur A-20	66 jours	Mar 14-07-01	Mar 14-09-30
45	**Phase 2D**	**196 jours**	**Mar 14-07-01**	**Mar 15-03-31**
46	Secteur Turcot	130 jours	Mer 14-10-01	Mar 15-03-31
47	Secteur De La Vérendrye	64 jours	Jeu 15-01-01	Mar 15-03-31
48	Secteur Montréal-Ouest	66 jours	Mar 14-07-01	Mar 14-09-30
49	Mise en service secteur Turcot	1 jour	Mar 15-03-31	Mar 15-03-31
50	Mise en service secteur De La Vérendry	1 jour	Mar 15-03-31	Mar 15-03-31
51	Mise en service secteur A-720	1 jour	Mar 15-03-31	Mar 15-03-31
52	Mise en service secteur A-20	1 jour	Mar 15-03-31	Mar 15-03-31
53	**Phase 3**	**327 jours**	**Mer 15-04-01**	**Jeu 16-06-30**
54	**Phase 3A**	**327 jours**	**Mer 15-04-01**	**Jeu 16-06-30**
55	Secteur Turcot	262 jours	Mer 15-04-01	Jeu 16-03-31
56	Secteur De La Vérendrye	197 jours	Mer 15-04-01	Jeu 15-12-31
57	Secteur A-720	197 jours	Mer 15-04-01	Jeu 15-12-31
58	Secteur Montréal-Ouest	131 jours	Mer 15-04-01	Mer 15-09-30
59	Secteur A-20	65 jours	Ven 16-01-01	Jeu 16-03-31
60	Secteur Notre-Dame	65 jours	Ven 16-04-01	Jeu 16-06-30
61	Mise en service secteur Montréal-Ouest	1 jour	Jeu 16-06-30	Jeu 16-06-30
62	**Phase 3B**	**196 jours**	**Jeu 15-10-01**	**Jeu 16-06-30**
63	Secteur Turcot	65 jours	Ven 16-04-01	Jeu 16-06-30
64	Secteur A-720	130 jours	Ven 16-01-01	Jeu 16-06-30
65	Secteur Montréal-Ouest	66 jours	Jeu 15-10-01	Jeu 15-12-31
66	**Phase 4**	**133 jours**	**Ven 16-07-01**	**Sam 16-12-31**
67	**Phase 4A**	**133 jours**	**Ven 16-07-01**	**Sam 16-12-31**
68	Secteur Angrignon	66 jours	Ven 16-07-01	Ven 16-09-30
69	Secteur Notre-Dame	133 jours	Ven 16-07-01	Sam 16-12-31
70	Mise en service secteur Notre-Dame	1 jour	Sam 16-12-31	Sam 16-12-31
71	**Phase 4B**	**133 jours**	**Ven 16-07-01**	**Sam 16-12-31**
72	Secteur Montréal-Ouest	66 jours	Ven 16-07-01	Ven 16-09-30
73	Secteur Angrignon	67 jours	Sam 16-10-01	Sam 16-12-31
74	**Phase 4C**	**67 jours**	**Sam 16-10-01**	**Sam 16-12-31**
75	Secteur Angrignon	67 jours	Sam 16-10-01	Sam 16-12-31
76	**Phase 4D**	**67 jours**	**Sam 16-10-01**	**Sam 16-12-31**
77	Secteur Angrignon	67 jours	Sam 16-10-01	Sam 16-12-31
78	Mise en service secteur Angrignon	0 jour	Sam 16-12-31	Sam 16-12-31

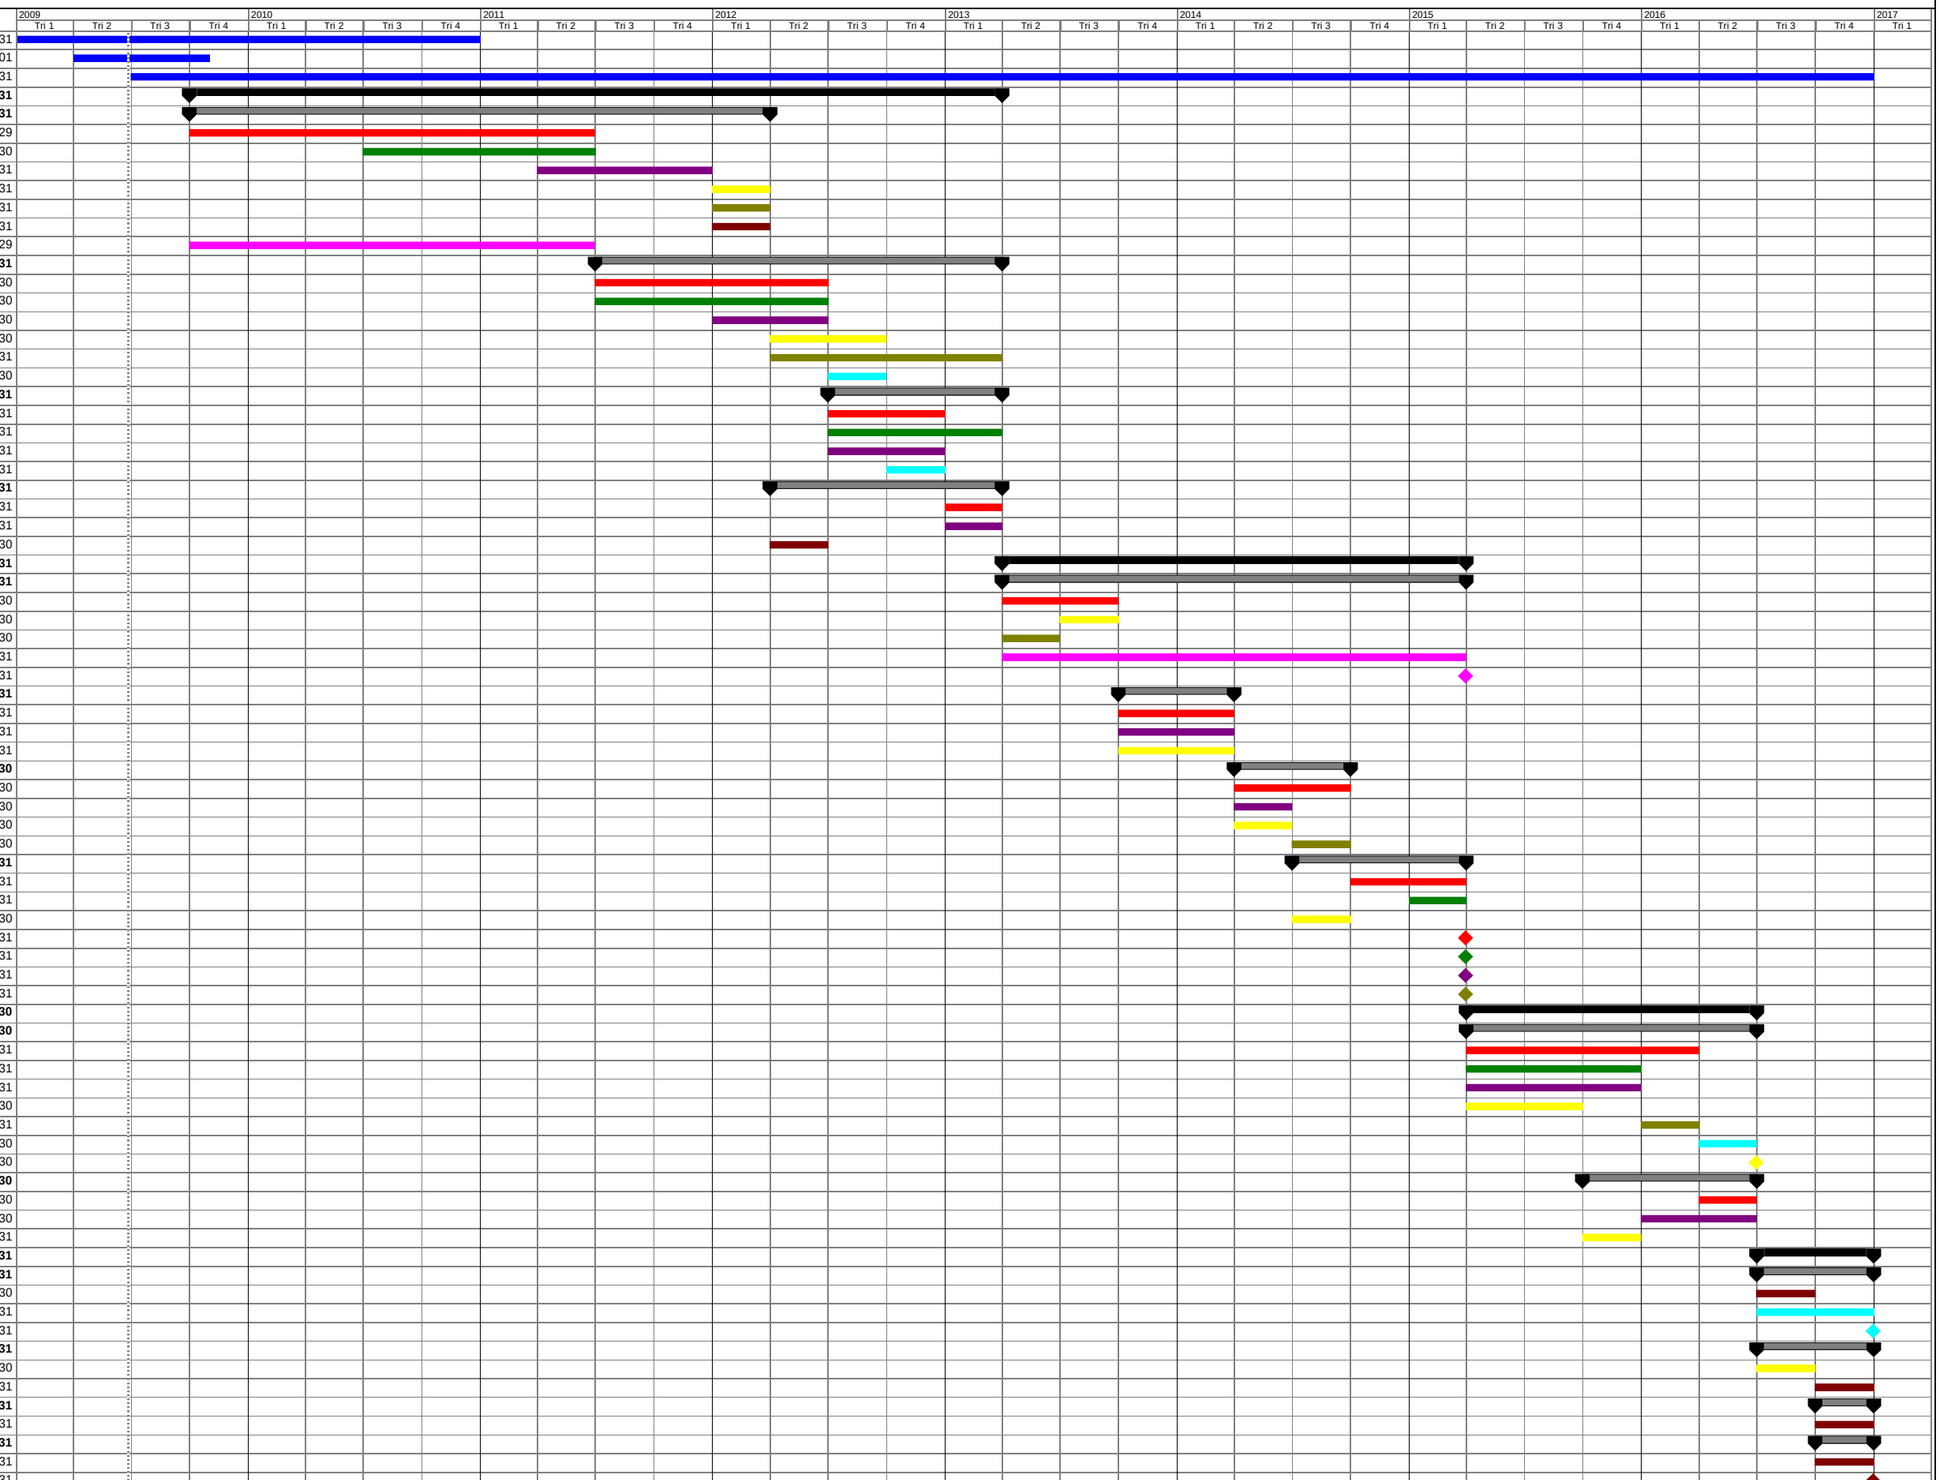

Projet : Échéancier de réalisation
Date : Jeu 09-06-25

Tâche | Fractionnement | Avancement | Jalon | Récapitulative | Récapitulatif du projet | Tâches externes | Jalons externes | Échéance
